

제9차 국제개발협력위원회

의결안건(제9-2호)

'11년 국제개발협력 통합평가계획

2011. 2.

국제개발협력 평가소위원회

목 차

I. ODA 통합평가 개요	61
II. 2010년도 ODA 시범통합평가 결과	62
III. 2011년 통합평가 추진계획(안)	65
IV. 향후 조치계획	72

< 별첨 > 시행기관별 자체평가계획

I. ODA 통합평가 개요

□ 추진경위

- 그간 ODA에 대한 평가는 기관별 자체평가만 실시해왔으며, 기관마다 기준 및 방법이 상이하고 국제기준에도 미흡

⇒ OECD DAC 가입, 국제협력기본법 제정에 따라 국제기준에 맞는 **ODA 통합평가시스템**을 도입('09.5)

* 통합평가소위 구성, 통합평가지침 및 매뉴얼 작성 완료('09.12)

□ 통합평가 개요

- (평가원칙) OECD DAC 등 국제기준을 적용하여 모든 ODA 사업에 공통적인 평가원칙 · 기준 · 절차를 적용

※ 평가기준 : 적절성, 효율성, 효과성, 영향력, 지속가능성

평가종류 : 정책/전략 · 국별 · 분야별 · 형태별 · 프로젝트/프로그램 평가

평가단계 : 사전평가, 중간평가, 종료평가, 사후평가

- (평가단계) 평가의 전문성과 객관성을 높이기 위해 시행 기관별 '자체평가'와 총리실 '소위평가'로 구분하여 실시

- (자체평가) 각 시행기관별로 소관 사업에 대해 자체평가를 실시하고, 총리실 평가소위에서 평가결과를 심의
- (소위평가) 자체평가와 별도로 평가소위(총리실)가 객관적인 입장에서 대표성 있는 사업을 선정, 유 · 무상 통합평가 실시

Ⅱ. 2010년도 ODA 시범통합평가 결과

1 시범통합평가 결과

◇ 새로운 통합평가지침 및 매뉴얼에 따라 소위평가 3건, 자체평가 28건 등 총 31건에 대한 평가계획을 수립하여 추진

□ (평가소위) 국별(캄보디아), 분야별(새마을 운동 전수), 주제별(유무상 연계사업) 평가 등 3건에 대한 평가를 정상 추진

○ 과제별로 평가소위 위원들이 **PM**으로 참석하고, 관계기관 합동으로 평가팀을 구성하여 평가 실시

○ 금년 소위평가는 평가지침·매뉴얼의 적절성 검토, 유무상 연계·통합을 위한 제도개선과제 발굴에 중점

* 3개 평가를 통해 29개 개선과제를 도출, 기관별로 개선토록 조치

□ (자체평가) 12개 기관에서 당초 계획된 28건 중 25건을 계획대로 추진하고, 3건은 평가 미실시

○ (사업부진) 부처에서 실시한 연초, 전체 28건에 대한 평가계획 중 총 25건에 대한 평가 실시

- 3건은 대상사업 지연, 사업성격의 부적절성 등의 사유로 평가제외

○ (지침준수) 형식적인 면에서는 국제개발협력 평가지침을 준수

○ (유형별) 사전평가, 중간평가, 종료평가, 사후평가로 다양

○ (객관성) 25건 중 10건은 외부평가, 15건은 내부평가 실시

2 시범평가 시사점 및 개선 필요사항

□ 정량적인 효과성·영향력 평가 미흡

- 평가지침에서 효과성, 영향력을 평가토록 하고 있으나 모든 평가가 정성적인 평가에 머물고 정량적인 평가 미 실시
 - * (예시) 관계자 면담 및 평가자 주관에 의해 ‘해당국의 산업발전에 긍정적인 영향을 미친 것으로 판단’ 등의 방식으로 기술
- 이는 CPS·사업계획 수립시 영향력 평가지표 개발 등 정량적인 평가를 위한 방법론과 평가인프라 부족에 기인

⇒ 모든 CPS 및 대규모 프로젝트(예시: 50억원 이상)에 대해서는 정량적인 영향평가를 실시하도록 기준 및 절차를 마련할 필요

□ 평가의 객관성 및 전문성 미흡

- (소위평가) 독립성은 확보되어 있으나, 3개 평가 모두 자체적으로 평가작업을 실시하여 전문성 확보가 미흡
 - * 전문성 보완을 위해 민간위원, 관계부처, 외부전문가를 평가팀에 참여시켰으나 몰입도가 저하
- (자체평가) KOICA, EDCF는 평가부서를 두고 외부평가를 실시하여 독립성과 전문성을 확보한 것으로 평가*
 - * 다만, 현재 시행기관이 평가용역을 발주하는 방식으로 추진하고 있어 진정한 평가의 독립성이 확보되었다고 보기는 어려움
 - 기타 부처의 경우 사업부서가 평가도 병행하고 있으며, 대부분 내부평가를 실시하여 전문성과 독립성 미흡

⇒ 사후평가는 외부평가를 원칙으로 하고, 장기적으로 독립된 평가전담기관을 설치하는 방안을 검토할 필요

□ 전체사업에 대한 진도 보고 · 관리 부재

- 각 시행기관의 경우 사업부서 및 담당자가 개별적, 자체적으로 진도관리(중간평가, 종료평가 등)를 실시
 - * KOICA, EDCF의 경우 사전평가 · 중간평가 · 종료평가는 사업부서, 사후평가는 평가부서에서 담당
- 따라서, 정부 전체 및 각 기관의 개별 사업들이 계획대로 추진되고 있는지, 진행상황을 제대로 관리하고 있는지 등에 대한 총괄적이고 독립적인 점검 · 관리시스템 부재

⇒ 각 시행기관이 추진 중인 사업들을 일괄 등록하고, 사업별 진행상황을 총괄관리할 수 있는 시스템을 구축 · 운영할 필요
* 현행 ODA 통계관리시스템을 보완하여 구축하는 방안 검토

□ 시행기관 자체평가의 평가결과 환류계획 미흡

- 대부분의 시행기관 자체평가에서 여러 가지 문제점 및 개선사항이 제시되었으나 이에 대한 후속 조치계획이 미흡
 - * KOICA는 '08년부터 별도의 사업평가실에서 사업부서의 후속 조치계획 이행여부를 주기적(분기 · 연간)으로 모니터링하는 환류시스템 운영
 - * EDCF는 '07년부터 신규사업 심사 시 동종사업 평가결과를 의무반영하는 환류시스템 운영


⇒ 모든 평가는 평가 이후 제시된 지적사항에 대해 조치계획을 마련하고, 이후 실제 조치여부를 확인 · 관리할 필요
* 소위평가는 3개 평가를 통해 29개 개선과제를 도출, 조치계획 수립

☞ 동 내용에 대한 관계기관 · 전문가 의견수렴을 거쳐 통합평가 지침 및 매뉴얼을 보완, 차기 국제개발협력위원회에 상정

Ⅲ. 2011년 통합평가 추진계획(안)

중 점 추 진 방 향

① ODA 사업의 단계별 평가·관리시스템 구축

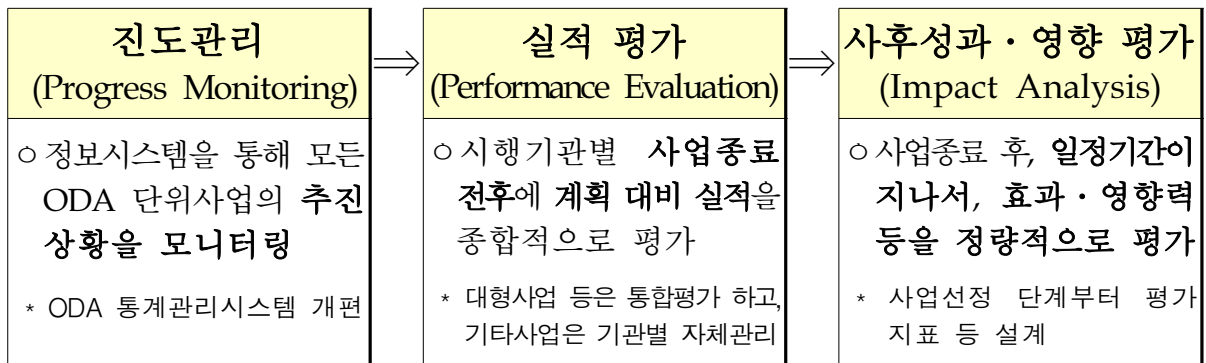

② 평가주체별 역할분담(소위평가·자체평가 평가방안)

- 소위평가, 자체평가 대상이 되는 과제성격을 명확히 구분하여 통합평가의 효과를 극대화
- 총 28개 평가 : 소위평가 3건, 자체평가 25건

③ 평가의 전문성·객관성 제고

- 사업수행과 독립적인 외부기관의 전담 평가 확대
- 수원국·외국기관과의 합동 평가, 국제기구 근무 경험자 참여 확대

④ 평가결과의 환류시스템 정착

- 평가결과 제기된 이슈에 대한 후속 조치방안 검토 의무화

1 ODA 사업의 단계별 평가·관리시스템 구축

◇ 각 시행기관의 모든 ODA 사업을 대상으로 사업추진 단계별로 통합적이고 체계적인 모니터링 및 평가체계를 정립

진도관리

Progress Monitoring

- 정보시스템을 구축하여 모든 ODA 시행기관의 진행 중인 ODA 단위사업을 등록하고 추진상황을 상호 모니터링
- ⇒ 수은(EDCF)에서 현행 통계시스템을 토대로 정보시스템 구축안을 마련하고, 관계기관 협의를 거쳐 단계적으로 구축

실적평가

Performance Evaluation

* '11년 총 28개 中 26개

- 모든 사업에 대해 시행기관별로 사업 종료 전후에 해당 사업이 계획대로 추진되었는지 등을 종합적으로 평가
- * 현재 시행기관이 실시하고 있는 평가는 대부분 수행평가에 해당
- 시행기관 자체적으로 추진하되, 대형 사업이나 집중검토가 필요한 사업은 통합평가대상으로 분류하여 관리

사후성과 및 영향평가

Impact Analysis

* '11년 총 28개 中 2개

- 사업 종료 후 일정기간(2~3년)이 경과한 시점에서 해당 사업이 발휘한 효과, 영향 등을 정량적으로 평가
 - 평가대상 : 대형 사업 또는 프로그램, CPS 등
 - 평가방법 : 원칙적으로 외부평가 실시
- 사후 영향평가 대상사업에 대해서는 사업선정 단계부터 사전평가를 통해 평가지표, 방법 등을 설계
- ⇒ 국제기구 등 평가실태 분석을 거쳐 우리나라 실정에 맞는 정량적인 성과(영향력)모델 개발·보급(KOICA)
 - KOICA의 자체평가계획 중 “에티오피아 모자보건계획” 평가 시 계량적인 영향력 평가를 시범 추진
 - * 현재, KDI에서도 일부 프로젝트 사업을 대상으로 실험적인 영향평가 준비 중

※ '사후성과 및 영향평가' 결과는 향후 CPS(Country Partnership Strategy) 수립에 반영

1. 소위평가 실시방안

◇ 다수기관이 관련되어 있는 사업, 제도 중 중복성을 해소하거나 효율성 제고가 시급한 사안을 중점 평가

□ (평가과제) 다자 및 양자사업을 대상으로 평가소위 심의(11.1.25)를 거쳐 총 3개 평가대상과제를 선정(*'10년도에는 양자사업만 실시)

< '11년 국제개발협력 소위평가 주제 선정결과 >

구 분		평가주제(안)
양자	분야별	① ICT분야 ODA - 방송통신 분야의 ODA 사업 및 제도에 대한 분석을 통해 성과 및 향후 정책방향 제시 * 관련 기관 : KOICA, EDCF, 행안부, 방통위 등
	주제별	② 정책 컨설팅 분석 - KSP, KOICA 정책자문 사업 등 우리나라 ODA 컨설팅 분야에 대한 비교·분석을 통해 향후 정책방향 제시 * 관련 기관 : KOICA, 재정부, 기타 개별부처
		③ 주요 부처 ODA system 분석 - 대규모 ODA 사업을 추진하고 있는 주요 부처·기관의 ODA 추진체계 등을 비교·분석하여 향후 정책방향 제시 * 관련 기관 : KOICA, EDCF, 복지부, 방통위 등

* [참고] '10년 국제개발협력 소위평가 : ① 캄보디아 ODA 지원 종합평가, ② 새마을운동 ODA 사업 평가, ③ 유·무상 연계 평가

※ UN·MDB 등 '다자기구 신탁기금'은 총리실 주관으로 실태파악 및 점검 실시

□ (추진방식) 과제별로 전문기관을 선정하여 평가를 의뢰하되, 소위위원 등이 평가팀에 참여

* 과제별 PM 등 세부사항은 평가소위 위원장이 위원들과 협의하여 결정

2. 시행기관 자체평가 실시방안

◇ 대형 프로젝트 사업 및 복수기관의 제도개선을 중심으로 통합적 평가 실시, 단년도 초청연수사업 등 통상적인 평가는 자체 관리

□ 관계기관 실무회의('11.1.11, 총리실)를 거쳐 당초 **11개 기관의 39개 평가계획**을 **6개 기관의 25개 평가계획**으로 협의·조정

(1) 평가실시기관별 평가계획(협의·조정 전) : 11개 기관의 39개 평가

< 평가실시기관별 평가계획(안)(협의·조정 전) >

평가기관	평가내용	평가방법
KOICA (11개 평가)	1. (국별평가, 1건) 이라크 재건 지원	외부
	2. (형태별 평가, 1건) 전문가 파견사업 종합평가	미정
	3. (주제별 평가, 1건) 수혜자 평가	외부
	4. (프로젝트 평가, 8건) 교육, 보건, 농촌, 행정제도, 산업에너지 등	외부
수은(EDCF) (8개 평가)	1. (국별평가, 1건) 인도네시아	외부
	2. (분야별 평가, 5건) 상하수도, 교통(2), 교육(2)	외부
	3. (프로젝트 평가, 2건) 인도네시아 병원 폐수 처리시설 확충 스리랑카 Galle 광역시 상수도개발	외부
부처·청 (9개 부처, 20개 평가)	1. 재정부(1건) : 개발경험공유(KSP) 사업 평가	외부
	2. 교과부(2건) : 정부초청 장학생 사업, 개도국 과학기술지원사업	외부
	3. 행안부(2건) : 개도국 정보접근센터, 해외 IT 전문가 초청연수	외부
	4. 농식품부(4건) : DR공고 추엔계 농촌종합개발, 모잠비크 영농 기술교육 시스템, 필리핀 농촌개발, 캄보디아 쌀산업 일관체계 구축	외부
	5. 복지부(7건) : 라오스 모자보건증진사업, 라오스 기생충 관리사업, 스리랑카 응급의료 기능강화사업, 캄보디아 일차보건의료 시범 사업, 캄보디아 모자보건증진 시범사업(조산사양성), 필리핀 결핵 관리 시범사업, 해외긴급구호 의료인력 교육훈련사업	외부
	6. 여가부(1건) : 개도국 여성 대상 직업능력개발 정책 교육훈련	외부
	7. 방통위(1건) : 해외방송통신전문가 초청연수사업	내·외부
	8. 농진청(1건) : 해외농업기술개발사업(KOPIA)	공동
	9. 산림청(1건) : 민간 사막화방지 조림 지원	외부

(2) 기관별 협의 · 조정 결과 : 6개 기관의 25개 평가

- (KOICA) ① ‘전문가 파견사업 종합평가’는 평가소위의 ‘정책 컨설팅 사업 평가’와 중복되므로 평가대상에서 제외
- ② 이라크 재건 사업은 불안정한 현지치안에 따른 제약을 감안, 평가실시방안을 재검토하고 평가대상에서는 제외
- ③ 아이티 사례 분석 등을 통해 긴급구호 추진체계 및 추진성과 평가를 추가(외교부 · 방재청 · 국방부 · 복지부, 119구조대, NGO 등)
- ④ ‘농촌분야 프로젝트 평가’는 농식품부의 유사사업 내용을 일부 포함하여 통합 · 연계평가 추진
- ⑤ “에티오피아 모자보건계획”으로 정량적 영향력 평가를 시범 추진
- ⑥ 수원국과의 공동평가 추진(콜롬비아, “중미카리브국 직업훈련 역량 강화사업”)
- (EDCF) ‘인도네시아 국별평가’ 시 유상분야 외에 KOICA의 무상분야 평가결과(‘09년)를 활용하여 통합적인 개선방안 도출
- (외교부) 범분야 이슈(cross-cutting issue) 평가방안 마련
 - * 외교부/KOICA가 주관하고, 재정부 · EDCF · 여성부 · 환경부 등 관련부처 참여
- (교과부) ‘정부초청 장학생 사업’ 평가 시, **KOICA**의 ‘장기 석사학위과정(SP)’과 비교 · 분석 추진
 - ‘개도국 과학기술지원사업’은 기관 간 교류협력이므로 통합 평가대상에서 제외하고, 부처 자체적으로 관리
- (행안부) ‘개도국 정보접근센터’ 및 ‘해외 IT 전문가 초청연수’는 평가소위의 ‘ICT 분야별 평가’와 중복되므로 제외

- (농식품부) 제출한 4개사업이 모두 현재 진행 중인 사업이므로 통합평가대상에서 제외하고 자체적으로 점검관리
 - 대신, '캄보디아 소액금융지원사업'을 KOICA 프로젝트 평가와 연계
- (복지부) 제출한 7개 평가 중 이제 시작단계인 6개 사업평가는 평가대상에서 제외하고, '해외긴급구호 보건의료 활동 및 성과평가'는 외교부·KOICA의 긴급구호와 연계·통합평가
- (여가부) '여성 대상 직업능력개발 정책 교육훈련사업' 평가를 제외하고, KOICA의 범분야 이슈 관리체계 마련에 참여
- (방통위) 소관사업은 자체점검하고 평가소위의 ICT 분야별 평가내용에 포함하여 평가
- (농진청·산림청) 모두 중간평가이므로 평가대상에서 제외

< '11년 국제개발협력 자체평가계획 조정(안) >

평가기관	평 가 내 용
KOICA (13개 평가)	1. (주제별 평가, 3건) 수혜자 평가, 국제빈곤퇴치기여금, 해외긴급구호* 2. (프로젝트 평가, 8건) 교육, 보건의료, 농어촌개발*, 행정제도, 정보통신 등 3. 영향력 평가 설계 및 사전 조사(1건) 4. 수원국과의 공동평가(콜롬비아)(1건)*
수은(EDCF) (8개 평가)	1. (국별평가, 1건) 인도네시아* 2. (분야별 평가, 5건) 상하수도, 도로(2), 교육(2) 3. (프로젝트 평가, 2건) 인도네시아 병원 폐수처리시설 확충, 스리랑카 Galle 상수도개발
중앙부처 (4개 부처, 4개 평가)	1. 재정부(1건) : 개발경험공유(KSP) 사업 평가 2. 교과부(1건) : 정부초청 장학생 사업(KOICA 유사사업과 비교·분석 포함) 3. 농식품부(1건) : 캄보디아 농촌마을 소액금융(Micro Credit) 지원 시범사업* 4. 복지부(1건) : 해외긴급구호 보건의료 활동 및 성과 평가*

※ ' * '표시 사업: 타 기관 또는 소위평가와 연계·합동 평가

3 평가의 전문성 · 객관성 제고

- 통합평가 대상으로 선정된 평가과제는 기본적으로 공모에 의한 외부기관 용역으로 추진
 - '10년 자체평가를 내부평가로 추진한 기관은 '11년 평가를 외부기관 용역으로 추진할 것을 우선 검토
 - 국제개발협력 평가소위의 평가도 금년부터 외부평가로 전환

- 수원국 또는 외국기관과의 합동평가 활성화
 - 평가계획 자체를 수원국 등과 합동으로 수립하고, 공동책임으로 평가 진행하는 방식을 도입
 - * (KOICA) 수원국 콜롬비아와의 합동평가 시범추진, 평가방법 및 절차 개선을 위해 JICA와의 현지조사 등 공동연구 추진
 - * (EDCF) 매년 베트남에 대해 6 Banks 그룹(WB, ADB, AFD, KfW, JICA)과 합동평가 추진 중, '11년 자체평가 8건 중 3건을 수원국과 공동평가 추진
 - 국내 기관이 평가하는 경우에도 평가팀 구성시 수원국 전문가, 국제기구 전문가 참여를 적극 검토

4 평가결과의 환류시스템 정착

- 자체평가 실시기관의 평가결과 검토 및 후속 조치방안 마련 의무화
 - 평가실시기관에서 평가결과에 대한 단기 및 중장기 환류계획을 작성하고 평가소위에서 심의
 - * 소위평가는 평가결과 후속조치계획 마련 기실시

- 환류계획의 이행상황을 평가소위에서 반기별 점검

IV. 향후 조치계획

- 국제개발협력위원회 상정 : '11. 2월
 - 평가소위 및 각 시행기관별 연간평가계획 확정

- 연간통합평가 세부계획 수립 및 발주 : ~ '11. 3월
 - 평가소위 및 각 시행기관별로 세부계획* 수립 및 평가기관 선정
 - * 세부 평가항목 및 착안사항, 평가팀 구성 등

- 기관별 평가 실시 : '11. 3월~10월

- 평가결과 종합 및 평가소위 상정 : '11년 4/4분기
 - * 필요시 2회(소위평가, 자체평가)에 나누어 상정

- 국제개발협력위원회 상정 : '11년 4/4분기

<별첨> 시행기관별 자체평가 계획서

순 서

1. 한국국제협력단 75
2. 한국수출입은행 81
3. 기 획 재 정 부 87
4. 교육과학기술부 88
5. 농림수산식품부 88
6. 보 건 복 지 부 90

2011년 자체평가계획(안)

○ 제출기관 : 한국국제협력단(KOICA)

평가대상사업명	1. 무상원조사업 수혜자 평가												
평가내용 (평가취지 및 평가대상 설명)	<p>○ 수원총괄기관 및 국내초청연수생을 대상으로, 사업의 적절성, 효과성, 파급효과 등에 대한 의견 수렴 및 분석, 종합결론 도출</p> <p>* 협력단은 1998년부터 수원국 관점의 평가 일환으로 동 평가 매년 실시</p>												
평가 구 분	실시 방법	<p>①내부평가(), ②외부평가(○), ③공동평가()</p> <p>* 외부, 공동평가 시 평가수행방법(외부기관 선정 등) 평가세부실시계획 수립 → 조달의뢰 및 공고 → 제안서 접수 및 기술심사 → 심사 결과통보 및 계약체결 후, 선정된 용역팀과 세부 평가방법 및 설계 확정</p>											
	시기	①사전평가(), ②중간평가(), ③종료평가(), ④사후평가(○)											
	대상	<p>①정책 및 전략평가(), ②국별평가(), ③분야별 평가(), ④주제별 평가(○), ⑤형태별 평가(), ⑥프로젝트/프로그램 평가()</p>											
	평가예산	30 백만원											
평가수행기간	'11. 3 ~ '11.9 (6개월)												
연간 추진일정	주요일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	▪ 평가 계획 수립												
	▪ 평가수행기관선정												
	▪ 평가설계												
	▪ 평가실시												
	▪ 보고서 작성												
기타 (기대성과, 유의사항 등)	<p>○ 수혜자평가는 매년 수행중이나, 2010년도 외부용역을 통해 평가방법 개선에 대한 연구를 수행한 바, 금년도에 동 방법론으로 시범 수행 예정</p>												
담당자(연락처)	사업평가실 우동완 대리(☎ 031-740-0313)												

2011년 자체평가계획(안)

○ 제출기관 : 한국국제협력단(KOICA)

평가대상사업명	2. 국제빈곤퇴치기여금 평가												
평가내용 (평가취지 및 평가대상 설명)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국제빈곤퇴치기여금은 2007년 관련법이 통과되어, 2008-2010년 간 총 3차에 걸쳐 집행되었음 ○ 동 기금은 2012년 운영완료 예정인 바, 향후 지속추진여부를 결정하기 위해 그 간 기금운용 성과와 개선사항에 대한 평가 필요 												
평가구분	실시방법	①내부평가(), ②외부평가(O), ③공동평가(O) * 외부, 공동평가 시 평가수행방법(외부기관 선정 등) 평가세부실시계획 수립 → 조달의뢰 및 공고 → 제안서 접수 및 기술심사 → 심사결과통보 및 계약체결 후, 선정된 용역팀과 세부 평가방법 및 설계 확정											
	시기	①사전평가(), ②중간평가(), ③종료평가(), ④사후평가()											
	대상	①정책 및 전략평가(), ②국별평가(), ③분야별 평가(), ④주제별 평가(O), ⑤형태별 평가(), ⑥프로젝트/프로그램 평가()											
	평가예산	80 백만원											
평가수행기간	'11. 3 ~ '11.9 (6개월)												
연간 추진일정	주요일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	▪ 평가 계획 수립												
	▪ 평가수행기관선정												
	▪ 평가설계												
	▪ 평가실시												
	▪ 보고서 작성												
기타 (기대성과, 유의사항 등)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평가범위는 당초 기금운용의 목표에 따라, 개도국민곤퇴치, 개발 NGO 역량강화, 국제빈곤에 대한 국민인식증진에 대한 성과를 평가하는데 중점을 둘 예정 ○ 관련 정책수립기관인 외교부와 평가수행 관련 긴밀한 협조 필요 												
담당자(연락처)	KOICA 사업평가실 차은주 과장(☎ 031-740-0311)												

2011년 자체평가계획(안)

○ 제출기관 : 한국국제협력단(KOICA)

평가대상사업명	3. 해외 긴급구호 추진체계 및 성과 종합평가												
평가내용 (평가취지 및 평가대상 설명)	<p>○ 2010년 아이티 긴급구호를 전후해 해외긴급구호 사업규모가 급속히 확대되고 국내 추진체계가 정비됨</p> <p>○ 이에 따라, 동 사업수행의 성과 및 체계를 점검해 향후 보다 효율적이고 효과적인 해외긴급구호 추진의 필요성이 제기됨</p> <p>- 평가범위는 1) 해외긴급구호 추진체계(국내외) 평가, 2) 아이티 긴급구호 성과 평가임</p> <p>※ 보건의료분야는 복지부가 실시하는 보건의료활동 평가와 연계 평가 실시</p>												
평가구분	실시방법	①내부평가(), ②외부평가(O), ③공동평가(O)											
	시기	* 외부 및 공동평가 수행											
	대상	①사전평가(), ②중간평가(), ③종료평가(), ④사후평가()											
	평가예산	①정책 및 전략평가(), ②국별평가(), ③분야별 평가(), ④주제별 평가(O), ⑤형태별 평가(), ⑥프로젝트/프로그램 평가()											
평가수행기간	'11. 3 ~ '11.9 (6개월)												
연간 추진일정	주요일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	▪ 평가 계획 수립												
	▪ 평가수행기관선정												
	▪ 평가설계												
	▪ 평가실시												
	▪ 보고서 작성												
기타 (기대성과, 유의사항 등)	○ 다수의 정부부처 및 NGO 등이 해외긴급구호에 참여하고 있어, 금번 평가의 설계, 수행, 보고에 적극적인 참여 및 의견수렴 필요												
담당자(연락처)	KOICA 사업평가실 차은주 과장(☎ 031-740-0311)												

2011년 자체평가계획(안)

○ 제출기관 : 한국국제협력단(KOICA)

평가대상사업명	4~11. 개별사업 사후평가 총 8건												
평가내용 (평가취지 및 평가대상 설명)	○ 교육, 보건, 농촌, 행정제도, ICT 등 협력단 8대 중점분야 위주로 프로젝트의 사후 영향력, 파급효과 등 점검												
평가 구 분	실시 방법	①내부평가(), ②외부평가(○), ③공동평가() * 외부, 공동평가 시 평가수행방법(외부기관 선정 등) 평가세부계획 확정에 따른 외부기관 공고, 적정업체 평가, 선정, 수행방식으로 진행											
	시기	①사전평가(), ②중간평가(), ③종료평가(), ④사후평가(○)											
	대상	①정책 및 전략평가(), ②국별평가(), ③분야별 평가(), ④주제별 평가(), ⑤형태별 평가(), ⑥프로젝트/프로그램 평가(○)											
	평가예산	400 백만원											
평가수행기간	'11. 3 ~ '11.9 (6개월)												
연간 추진일정	주요일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	▪ 평가 계획 수립												
	▪ 평가수행기관선정												
	▪ 평가설계												
	▪ 평가실시												
	▪ 보고서 작성												
기타 (기대성과, 유의사항 등)	○ 중점분야별 대표적 사업에 대한 사후평가를 실시하여, 사업성과를 점검하고 향후 개선방안 모색 - 기존 사후평가에서 정성적평가(특히 만족도조사) 위주로 수행된 점을 보완, 금년도에는 정량평가 확대 및 정성적평가에 수혜자시각을 깊이 있게 반영하는 쪽으로 평가방법 개선 예정 * 농림부와 공동 사후평가 수행 - 농림부 캄보디아 소액금융지원 시범사업 컨설팅('09-10/180백만원) - KOICA 캄보디아 캄풍참주 농촌개발사업(06-08/1백만불)												
담당자(연락처)	KOICA 사업평가실 차은주 과장(☎ 031-740-0311)												

2011년 자체평가계획(안)

○ 제출기관 : 한국국제협력단(KOICA)

평가대상사업명	12. 에티오피아 가족계획사업 Impact Evaluation												
평가내용 (평가취지 및 평가대상 설명)	<p>○ 원조예산이 실제 개발도상국에 어떠한 성과를 가져오고 있는지에 대한 보다 면밀한 평가의 필요성 증대</p> <p>○ 이에 따라, Impact Evaluation이 가능하도록 설계된 표제사업을 대상으로 금년도에 사전조사 및 Impact Evaluation 설계 추진</p>												
평가구분	실시방법	<p>①내부평가(O), ②외부평가(), ③공동평가()</p> <p>* 외부 전문가(보건분야 또는 평가분야)를 섭외해 KOICA 연구원과 평가팀 구성</p>											
	시기	①사전평가(), ②중간평가(), ③종료평가(), ④사후평가()											
	대상	<p>①정책 및 전략평가(), ②국별평가(), ③분야별 평가(), ④주제별 평가(O), ⑤형태별 평가(), ⑥프로젝트/프로그램 평가()</p>											
	평가예산 50 백만원												
평가수행기간	'11. 3 ~ '11.9 (6개월)												
연간 추진일정	주요일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	▪ 평가 계획 수립												
	▪ 평가팀 구성												
	▪ 평가설계												
	▪ 평가실시												
	▪ 보고서 작성												
기타 (기대성과, 유의사항 등)	○ 금년도 평가 설계 이후 3년여 간 지속적인 Data collection 및 점검 필요												
담당자(연락처)	KOICA 사업평가실 조정현 연구원 (☎ 031-740-0317)												

2011년 자체평가계획(안)

○ 제출기관 : 한국국제협력단(KOICA)

평가대상사업명	13. 중미·카리브국가 직업훈련 역량강화사업 공동평가												
평가내용 (평가취지 및 평가대상 설명)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수원국과의 공동평가는 수원국의 주인의식(Ownership)을 고취하고, 수원국의 평가역량을 강화하는 차원에서 장려되고 있음 ○ 이에 따라, 콜롬비아와 남남협력으로 추진중인 표제 사업에 대한 한국-콜롬비아 간 공동평가 수행 예정 												
평가 구 분	실시 방법	①내부평가(O), ②외부평가(), ③공동평가(O) * 외부 전문가(보건분야 또는 평가분야)를 섭외해 KOICA 연구원과 평가팀 구성											
	시기	①사전평가(), ②중간평가(), ③종료평가(), ④사후평가()											
	대상	①정책 및 전략평가(), ②국별평가(), ③분야별 평가(), ④주제별 평가(O), ⑤형태별 평가(), ⑥프로젝트/프로그램 평가()											
	평가예산 50 백만원												
평가수행기간	'11. 3 ~ '11.9 (6개월)												
연간 추진일정	주요일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	▪ 평가 계획 수립												
	▪ 평가팀 구성												
	▪ 평가설계												
	▪ 평가실시												
	▪ 보고서 작성												
기타 (기대성과, 유의사항 등)	○ 동 사업은 단년도 사업(50만불/8개월)으로 계획되었으나, 2011년도 평가결과에 따라 향후 3개년 추가지원여부를 결정할 예정인 바, 성과에 대한 보다 심도 깊은 평가를 추진할 예정												
담당자(연락처)	KOICA 사업평가실 차은주 과장 (☎ 031-740-0311)												

2011년 자체평가계획(안)

○ 제출기관 : 한국수출입은행(EDCF)

평가대상사업명	1. 인도네시아 국별지원 종합평가													
평가내용 (평가취지 및 평가대상 설명)	○ 인도네시아는 '10년 말 현재 EDCF 지원규모 상위*이며 '11-'15년 양허성차관 국별재원배분 계획 비중 2위로, EDCF의 인도네시아 경제개발 및 빈곤감축에의 기여성과 분석이 필요한 시점이며, 동 평가를 통해 도출된 제언을 추후 CPS 수립('11년 5~8월 계획)에 반영할 필요 * 승인기준 2위 (19건, 546백만불, 8.7%), 집행기준 4위(2,125억원, 7.8%) ※ 승인 및 집행기준 1위인 베트남에 대해서는 '10년 평가													
	평가구분	실시방법	①내부평가(), ②외부평가(V), ③공동평가() ○ 평가기관 : 한국개발전략연구소(KDS) ○ 공정성·독립성을 확보하기 위해 경쟁입찰을 통해 외부평가기관 선정('10.12)											
		시기	①사전평가(), ②중간평가(), ③종료평가(), ④사후평가()											
		대상	①정책 및 전략평가(), ②국별평가(V), ③분야별 평가(), ④주제별 평가(), ⑤형태별 평가(), ⑥프로젝트/프로그램 평가()											
평가예산	95백만원 (인니 병원폐수 처리시설 확충사업 사후평가 금액 포함)													
평가수행기간	'10. 12 ~ 11. 5 (6 개월)													
연간 추진일정	주요일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	▪ 문헌조사 및 분석													
	▪ 현지조사													
	▪ 중간보고서 작성													
	▪ 최종보고서 작성													
	▪ 용역보고서 제출													
기타 (기대성과, 유의사항 등)	○ 인도네시아 국별지원전략(CPS) 평가를 통한 대 인도네시아 EDCF 지원전략 진단 ○ 인도네시아 지원사업의 추진과정 평가를 통한 사업 추진의 효율성 제고 ○ 인도네시아 지원사업의 결과 평가를 통한 지원효과 분석													
담당자(연락처)	선임심사역 선우유민 (☎ 3779 - 5360)													

2011년 자체평가계획(안)

○ 제출기관 : 한국수출입은행(EDCF)

평가대상사업명	2. 상하수도 분야 지원 평가												
평가내용 (평가취지 및 평가대상 설명)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상하수도 분야는 개도국의 기후변화 대응역량 강화 및 지속 성장 기반 조성을 위해 중점지원중인 녹색성장 분야* 중 하나 * 태양광, 풍력, 바이오, 상하수도·폐수처리, 폐기물 처리, 소수력 ○ 동 분야는 '10년 말 현재 EDCF 지원실적 기준 상위*에 해당하며 EDCF 최우선지원분야의 하나로 향후에도 꾸준한 지원 예상 * 승인기준 2위 (28건, 715백만불, 11.4%), 집행기준 4위(2,406억원, 8.8%) ○ 전략적 포지셔닝 및 전반적 성과 등 top-down 및 DAC 5대 기준 및 cross-cutting 이슈를 반영한 bottom-up 방식의 평가 실시를 통해 동 분야 지원의 수원국 발전에의 기여도 및 향후 지원에의 제언 도출 												
평가 구 분	실시 방법	<ul style="list-style-type: none"> ①내부평가(), ②외부평가(V), ③공동평가() ○ 평가기관 : 미정 ○ 공정성·독립성을 확보하기 위해 경쟁입찰을 통해 외부평가기관 선정 											
	시기	①사전평가(), ②중간평가(), ③종료평가(), ④사후평가()											
	대상	①정책 및 전략평가(), ②국별평가(), ③분야별 평가(V), ④주제별 평가(), ⑤형태별 평가(), ⑥프로젝트/프로그램 평가()											
	평가예산												
60 백만원 (스리랑카 Galle 광역시 상수도 개발사업 사후평가 포함)													
평가수행기간													
'11. 5 ~ 9 (5 개월)													
연간 추진 일정	주요일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	▪ 용역업체 선정												
	▪ 문헌조사												
	▪ 현지조사 및 중간 보고서												
	▪ 최종보고서												
	▪ 용역보고서 제출												
기타 (기대성과, 유의사항 등)	○ 전문가 면담 및 간담회 실시 등을 통한 향후 동 분야 지원에의 전략적인 제언 도출												
	○ 국가별 지원형태 비교 등을 통한 향후 사업 추진의 효율성 제고												
	○ EDCF 첫 분야별평가로서, 분야별평가모델 수립 효과 기대												
담당자(연락처)	심사역 이효선 (☎ 3779 - 6581)												

2011년 자체평가계획(안)

○ 제출기관 : 한국수출입은행(EDCF)

평가대상사업명	3~4. 도로분야 지원사업 사후평가 (2건) (스리랑카 발란고다~반다라웰라간 도로개보수 사업, 캄보디아 캄포트~트라판로포 도로 개보수 사업)												
평가내용 (평가취지 및 평가대상 설명)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스리랑카 도로개보수 사업(18백만불)과 캄보디아 도로 개보수 사업(17백만불)은 각각 '07.5월, '08.5월 완공되었으며, 그로부터 2년 이상 운영기간 경과한 시점에서 사후평가를 실시하여 사업의 영향력 확인 및 필요 조치사항 파악 ○ 도로(건설 및 보수)는 EDCF 최대 지원분야로서, 개도국 경제성장의 원천이며 특히 민간부문 경제활동 촉진에 기여하여 지속적 성장을 돕는 필수 요소임. 우리의 수원경험을 통해서 이미 그 성과가 증명된 바 있으며, 본 사후평가를 통해 도로 분야 지원이 수원국 경제발전에 미친 파급효과를 확인할 수 있음 												
평가구분	실시방법	①내부평가(), ②외부평가(V), ③공동평가(V) ○ 평가기관 : 미정 ○ 공정성·독립성을 확보하기 위해 경쟁입찰을 통해 외부평가자(기관) 선정											
	시기	①사전평가(), ②중간평가(), ③종료평가(), ④사후평가(V)											
	대상	①정책 및 전략평가(), ②국별평가(), ③분야별 평가(), ④주제별 평가(), ⑤형태별 평가(), ⑥프로젝트/프로그램 평가(V)											
평가예산	25 백만원												
평가수행기간	'11. 5 ~ 11. 8 (4 개월)												
연간 추진일정	주요일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	· 용역업체 선정												
	· 문헌조사												
	· 현지조사 및 중간보고서												
	· 최종보고서												
기타 (기대성과, 유의사항 등)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스리랑카 및 캄보디아는 수원태도 및 협조가 양호하나 EDCF 주재원이 없는 점을 감안, 현지조사 등 평가일정이 다소 지연될 수 있음 ○ 향후 EDCF 스리랑카(승인기준 3위, 집행기준 2위) 및 캄보디아(승인 및 집행기준 6위) 국별지원 종합평가, 교통(도로)분야(승인 및 집행기준 1위) 지원평가 시 동 평가결과 활용 및 참고 												
담당자(연락처)	선임심사역 선우유민 (☎ 3779 - 5360)												

2011년 자체평가계획(안)

○ 제출기관 : 한국수출입은행(EDCF)

평가대상사업명	7. 인도네시아 병원폐수 처리시설 확충사업 사후평가												
평가내용 (평가취지 및 평가대상 설명)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인니 병원폐수 처리시설 확충사업(40백만불)은 인니 보건성 산하 42개 지방 공립병원에 병원 폐수처리 시설을 건립하고 수질관리 및 설비 운영관리 교육훈련을 실시한 사업으로 병원위생과 인근지역 환경보호에 기여한 녹색분야 지원사업 ○ 완공점검 실시('08.4) 후 2년 이상 운영기간 경과한 시점에서 사후 평가를 실시하여 사업의 효과성 확인 및 필요 조치사항 파악 												
평가구분	실시방법	①내부평가(), ②외부평가(V), ③공동평가() ○ 평가기관 : 한국개발전략연구소(KDS) (인니 국별지원 종합평가와 동일) ○ 공정성·독립성을 확보하기 위해 경쟁입찰을 통해 외부평가기관 선정('10.12)											
	시기	①사전평가(), ②중간평가(), ③종료평가(), ④사후평가(V)											
	대상	①정책 및 전략평가(), ②국별평가(), ③분야별 평가(), ④주제별 평가(), ⑤형태별 평가(), ⑥프로젝트/프로그램 평가(V)											
평가예산	95 백만원 (인니 국별지원 종합평가 금액에 포함)												
평가수행기간	'10. 12 ~ 11. 4 (5 개월)												
연간 추진일정	주요일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	▪ 문헌조사												
	▪ 현지조사												
	▪ 중간보고서												
	▪ 최종보고서 제출												
기타 (기대성과, 유의사항 등)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폐수처리시설사업 평가를 통해 병원주변의 수질오염 방지 및 질병 발생 억제 등 효과 및 영향력을 확인하고 후속조치 및 유사사업 관련 제언 도출 ○ 인도네시아는 언어소통과 수원태도가 양호하지 않은 등의 문제로 현지조사 등 평가일정이 다소 지연될 수 있음 												
담당자(연락처)	심사역 이진의 (☎ 3779 - 6596)												

2011년 자체평가계획(안)

○ 제출기관 : 한국수출입은행(EDCF)

평가대상사업명	8. 스리랑카 Galle 광역시 상수도 개발사업 사후평가												
평가내용 (평가취지 및 평가대상 설명)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동 사업은 1,2차(보충용자 포함)에 걸쳐 지원되었으며, 1차 사업(26.7백만불)을 통해 정수처리시설, 취수시설 및 저수시설을 공급하고 2차(21.2백만불) 사업을 통해 배수시설을 확충함으로써 인간의 기본 욕구(BHN) 충족 및 공공보건 증진에 기여한 사업 ○ 1,2차 사업은 각각 '05.3월, '08.12월 완공되었으며 이후 2년 이상의 운영기간이 경과된 바, 사후평가를 통해 파급효과를 확인하고 지속가능성 제고 및 타사업에의 활용을 위한 필요 후속조치(Follow-up actions) 도출 												
평가구분	실시방법	①내부평가(), ②외부평가(V), ③공동평가(V) ○ 평가기관 : 미정 ○ 공정성·독립성을 확보하기 위해 경쟁입찰을 통해 외부평가기관 선정 (상하수도 분야 지원 평가 실시기관과 동일한 기관으로 하여 평가의 효율성 제고)											
	시기	①사전평가(), ②중간평가(), ③종료평가(), ④사후평가(V)											
	대상	①정책 및 전략평가(), ②국별평가(), ③분야별 평가(), ④주제별 평가(), ⑤형태별 평가(), ⑥프로젝트/프로그램 평가(V)											
	평가예산												
60 백만원													
평가수행기간													
'11. 5 ~ 8 (5 개월)													
연간 추진일정	주요일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	▪ 용역업체 선정												
	▪ 문헌조사												
	▪ 현지조사 및 중간 보고서												
	▪ 최종보고서												
기타 (기대성과, 유의사항 등)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업의 지원효과 확인 뿐 아니라 EDCF 지원 및 스리랑카의 수원 절차 등에의 개선점도 도출 ○ '상하수도 분야 지원 평가'에도 반영될 수 있도록 조기 실시 												
담당자(연락처)	심사역 이효선 (☎ 3779 - 6581)												

2011년 자체평가계획(안)

○ 제출기관 : 교육과학기술부

평가대상사업명	정부초청장학생 사업(GKS)												
평가내용 (평가취지 및 평가대상 설명)	○ 정부초청장학생 사업은 개도국의 촉망받는 인재들을 장학생으로 선발하여 우리나라 대학에서의 학위과정 교육 및 연수기회를 제공하는 사업으로 OECD DAC에서 채택한 개발원조 평가원칙을 준용하여 정부초청장학생 사업의 성과를 분석하고 KOICA의 장기석사학위과정(SP)과 비교·분석 등을 통해 향후 발전방향을 도출하고자 함												
평가구분	실시방법	①내부평가(), ②외부평가(○), ③공동평가() * 정부초청장학생사업은 교과부가 추진해 온 대표적인 교육ODA사업으로 '10년도에는 외부전문가를 지정하여 평가를 실시하였으며, '11년도에도 외부 전문가 평가를 실시하고, 평가의 전문성을 지닌 기관을 선정하여 평가의 공정성·독립성·신뢰성을 확보할 예정임											
	시기	①사전평가(), ②중간평가(), ③종료평가(○), ④사후평가()											
	대상	①정책 및 전략평가(), ②국별평가(), ③분야별 평가(), ④주제별 평가(), ⑤형태별 평가(), ⑥프로젝트/프로그램 평가(○)											
	평가예산	20백만원											
평가수행기간	'11. 5월 ~ 9월(5개월)												
연간 추진일정	주요일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	▪ 평가기관 선정												
	▪ 평가문항개발												
	▪ 평가실시												
	▪ 평가결과 종합 및 보고서 작성												
	▪ 평가결과제출												
기타 (기대성과, 유의사항 등)	○ (기대성과) 향후 정책 수립 방향 제시 및 근거 자료 축적 - KOICA의 장기석사학위과정(SP)과 비교·분석 등을 통해 정부초청장학생 사업 추진 방향, 적절한 규모, 내실화 방안 마련												
담당자(연락처)	국제협력전략팀 이주현 사무관(☎2100 - 6766)												

2011년 자체평가계획(안)

○ 제출기관 : 농림수산식품부

평가대상사업명	캄보디아 농촌마을 소액금융(Micro Credit) 지원 시범사업('09.4~'10.4)												
평가내용 (평가취지 및 평가대상 설명)	○ 농업 소득의 증대 및 비농업분야 사업개발 지원을 통해 마을개발의 자립성 제고 - 내재적 자본이 부족한 농촌지역의 농외소득원 개발을 위해 소액금융 지원을 실시하여 소득원 개발을 도모하고 농민의 자립성을 제고하기 위한 사업 - 정부주도의 직접적 농촌소득원 개발이 아닌 간접적 지원 정책으로 수혜대상의 유인 일치 및 제도적 미비 문제점도 일정 부분 극복 가능 ○ KOICA의 캄보디아 농촌종합개발사업과 연계 평가 가능 - KOICA 사업과 연계평가를 통해 각 사업의 효과성 및 영향력에 대해 객관적으로 평가하여, 사업 절차 및 연계 등 사업추진 체계에 대해 전반적 점검 가능 ※ '07~'09년 KOICA가 수행한 캄보디아 농촌종합개발사업 컨설팅 결과에서 자금 및 기술지원을 농업협력의 효과적인 방안으로 제시한 바 있음.												
	평가구분	실시방법	①내부평가(), ②외부평가(○), ③공동평가() ○ 평가의 독립성 및 공정성 제고를 위해 외부 평가기관을 선정하여 서면평가 및 현지조사 실시 ○ 외부 평가기관 선정, 평가자료 협조 및 평가 일정 등 구체적 내용은 KOICA와 추후 논의(잠정)										
시기		①사전평가(), ②중간평가(), ③종료평가(), ④사후평가(○)											
대상		①정책 및 전략평가(), ②국별평가(), ③분야별 평가(), ④주제별 평가(), ⑤형태별 평가(), ⑥프로젝트/프로그램 평가(○)											
평가예산		10 백만원											
평가수행기간	'11. 4 ~ '11. 10 (7 개월) (잠정)												
연간 추진일정	주요일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	▪ 평가계획 수립 및 제출												
	▪ 세부평가계획수립												
	▪ 평가시행 (서면, 현지조사)												
	▪ 평가 보고서 작성												
	▪ 평가결과 보고 및 발표회 개최												
기타 (기대성과, 유의사항 등)	○ 사업평가를 통해 사업의 효과성 및 영향력을 파악하고, 유사 사업 추진을 위한 기초 자료로 활용, '11년 계획 중인 캄보디아 소액금융지원 사업에 평가결과 반영 ○ KOICA의 캄보디아 농촌종합개발사업과 연계 평가를 통해 농촌 분야 개발협력 사업의 미비점 및 개선점 파악을 파악하여 향후 전략 수립 및 추진에 활용												
담당자(연락처)	양자협상협력과 송재원 사무관(☎02-500-1871)												

2011년 자체평가계획(안)

○ 제출기관 : 보건복지부

평가대상사업명	해외긴급구호 보건의료 활동 및 성과 평가												
평가내용 (평가취지 및 평가대상 설명)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해외 재난 발생시 의료지원 등 보건의료분야가 차지하는 비중은 매우 크나, 현재까지 보건의료분야의 성과가 평가된 경험이 없음 * 복지부는 2009년부터 해외재난 대비 보건의료인력 교육, 시설 및 물자관리, 자문 등 상시 지원을 실시 중임 - 미얀마(2008), 아이티지진(2010년) 긴급 구호시 의료지원체계, 인력, 시설 및 장비 등 보건의료분야의 지원 성과평가 도출 및 일부 제도적 미비점도 극복 가능 ○ KOICA(“아이티 긴급구호 추진체계 및 성과종합평가”)와 연계 평가 실시 												
평가구분	실시방법	①내부평가(), ②외부평가(O), ③공동평가(O) * 외부 및 공동평가 수행 - 긴급구호중 보건의료분야의 전문성을 가진 응급의학회 및 재난의학회 등 전문가를 중심으로 현장 방문, 문헌고찰, 선진 사례 조사, 전문가 delphi 등을 통해 아이티 지진 구호 시스템중 보건의료분야의 문제점과 개선방안 등을 제언											
	시기	①사전평가(), ②중간평가(), ③종료평가(), ④사후평가(O)											
	대상	①정책 및 전략평가(), ②국별평가(), ③분야별 평가(), ④주제별 평가(O), ⑤형태별 평가(), ⑥프로젝트/프로그램 평가()											
	평가예산	60백만원											
평가수행기간	'11. 3 ~ '11.9 (6개월)												
연간 추진일정	주요일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	▪ 평가 계획 수립												
	▪ 평가수행기관선정												
	▪ 평가설계												
	▪ 평가실시												
	▪ 보고서 작성												
기타 (기대성과, 유의사항 등)	○ KOICA의 긴급구호평가와 연계하여 평가 모형을 개발하고, 향후 보건의료분야 긴급구호 방향 제시 및 내실화 방안 마련												
담당자(연락처)	국제협력담당관실 양진선(☎ 2023-7226)												
